


КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Отчет о реализации проекта «Точка общественной жизни»

Микрорайон «Акуловские пруды» деревня Акулово
ТОС «Акулово»

2021 год



Цель конкурсного проекта «Точка общественной жизни»

Создать на месте заброшенного участка и оврага, расположенного на территории микрорайона «Акуловские пруды» деревни Акулово, современное общественное пространство для организации совместного досуга детей и взрослых жителей деревни.

Задачи проекта

1) Терраформирование заброшенной территории на основе проекта, сформированного с привлечением жителей для устройства общественного пространства.


2) Вовлечение жителей в благоустройство территории и организацию совместного досуга.



Спутниковая схема



Топосъемка территории

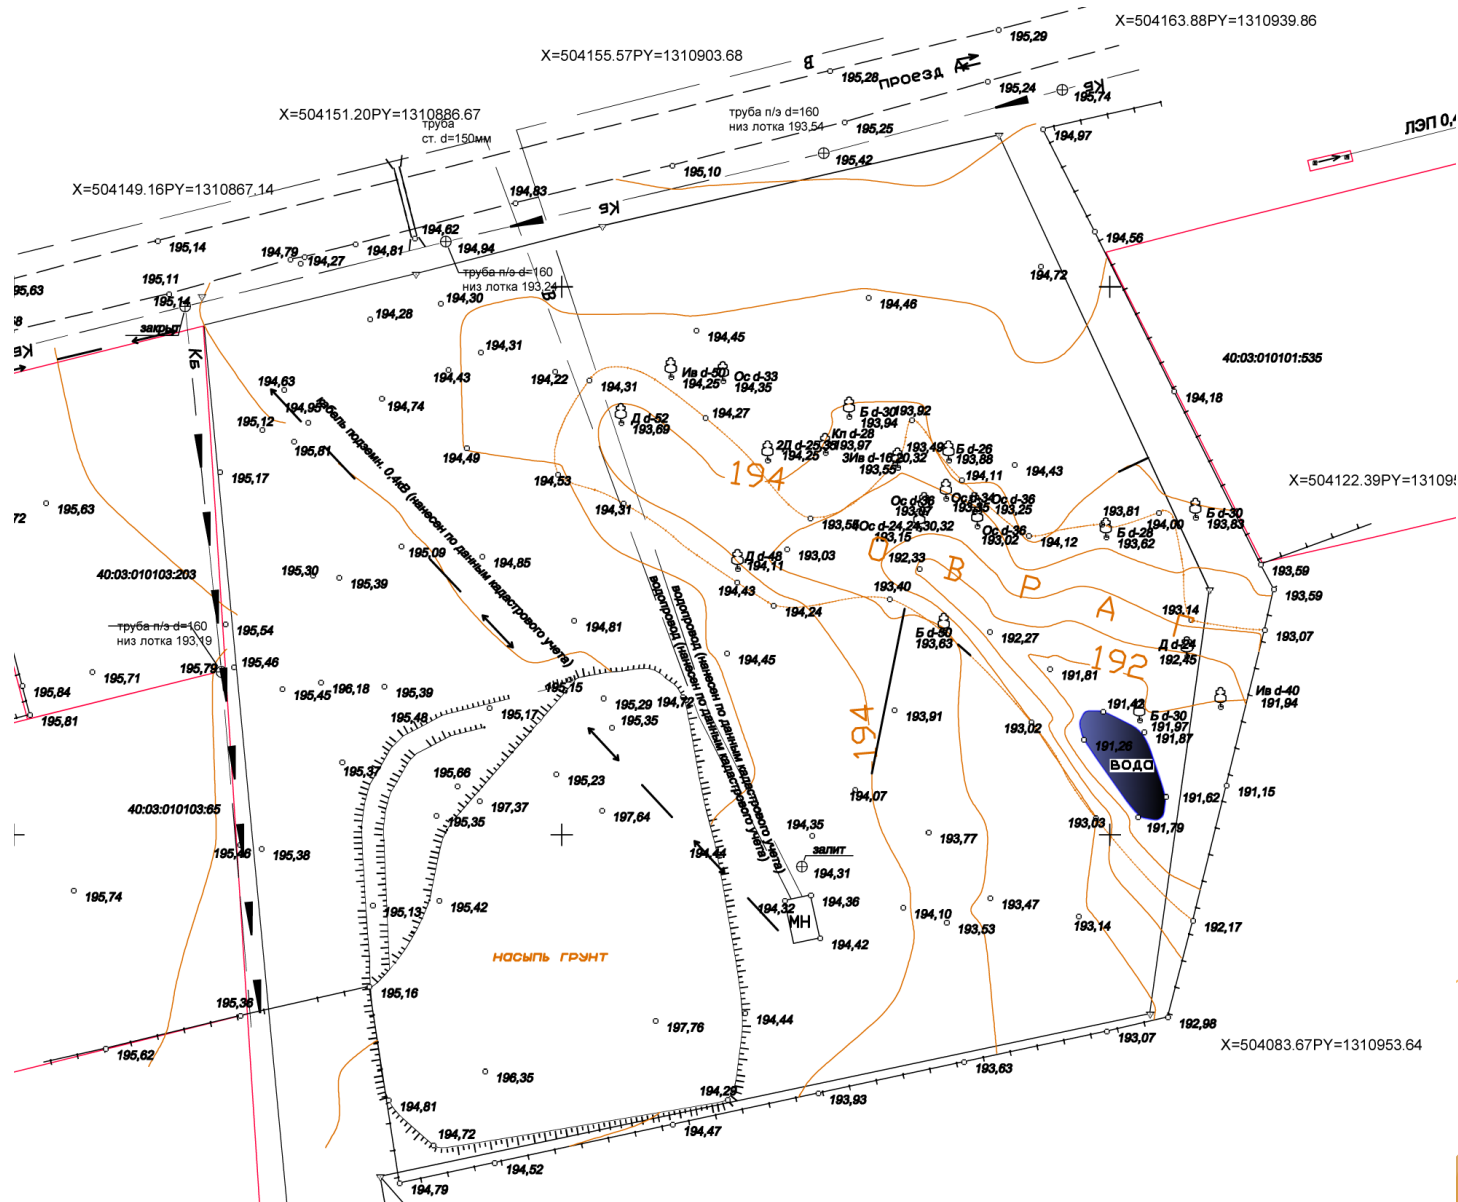

Территория до начала проекта



Территория до начала проекта



Территория до начала проекта



Содержание проекта «Точка общественной жизни»


В 2021 году, как и предполагалось проектом, выполнен первый этап благоустройства общественной территории в деревне Акулово, а именно:

- ▶ создание проекта общественной территории;
- ▶ терраформирование земельного участка;
- ▶ организация освещения общественной территории;
- ▶ создание тропинойной сети базового уровня (выполнение в щебне);
- ▶ установка базовых малых форм (скамейки).
- ▶ озеленение хвойными растениями

Этапы выполнения работ. Проект развития территории.



Этапы выполнения работ. Проект работ в рамках конкурса 2021 года.

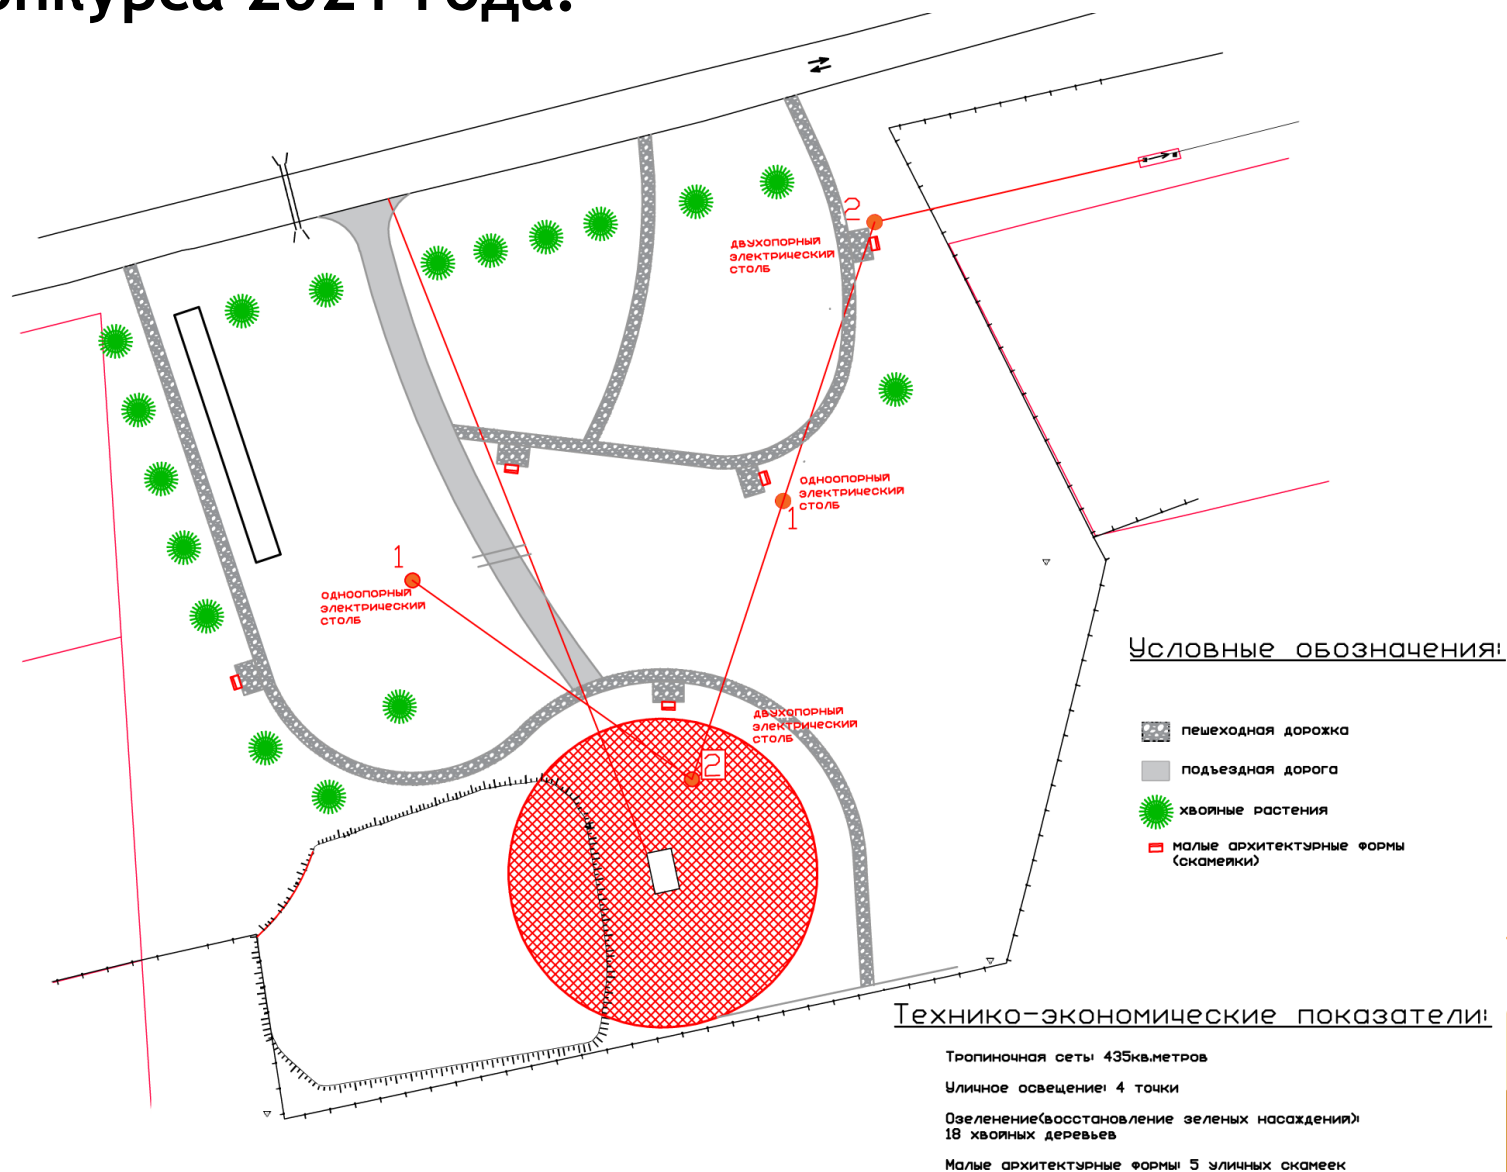

Этапы выполнения работ. Опиловка деревьев и кустарника.



Этапы выполнения работ. Опиловка деревьев и кустарника.



Этапы выполнения работ. Планировка территории.



Этапы выполнения работ. Планировка территории.



Этапы выполнения работ. Планировка территории.



Общая площадь территории, охваченная планировочными работами, составила почти 7 000 кв. метров

Этапы выполнения работ. Организация тропинойной сети.



Этапы выполнения работ. Организация тропинойной сети.




Этапы выполнения работ. Организация тропинойной сети.




Тропинойная сеть выполнена в гравийном исполнении с подложкой из нетканого геотекстиля. Протяженность тропинойной сети 435 метров.

Этапы выполнения работ. Организация уличного освещения


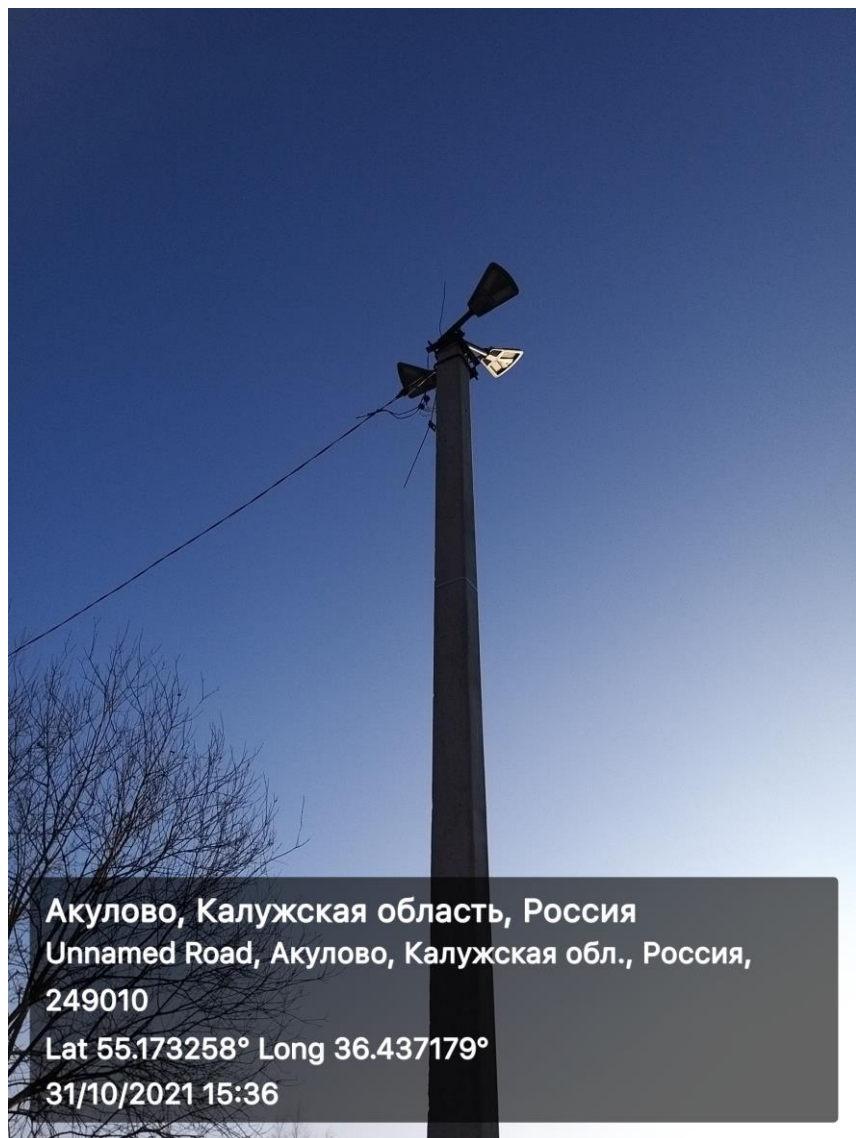


Этапы выполнения работ. Организация уличного освещения

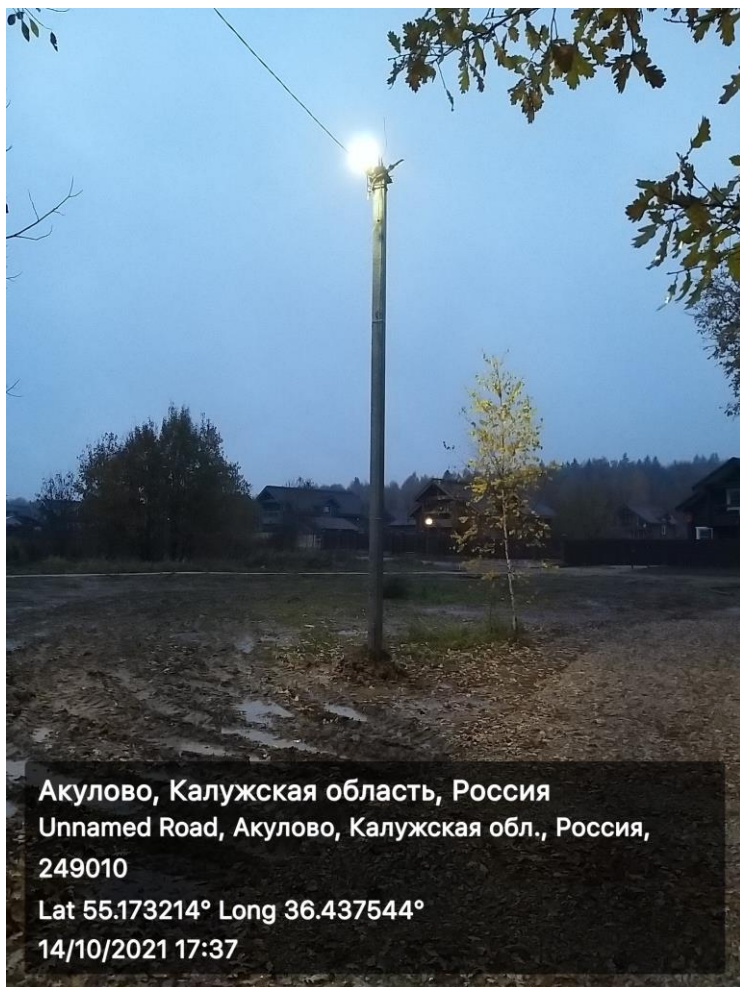


Установлено 6 фонарных столбов с 8 уличными светодиодными светильниками.

Этапы выполнения работ. Малые формы.

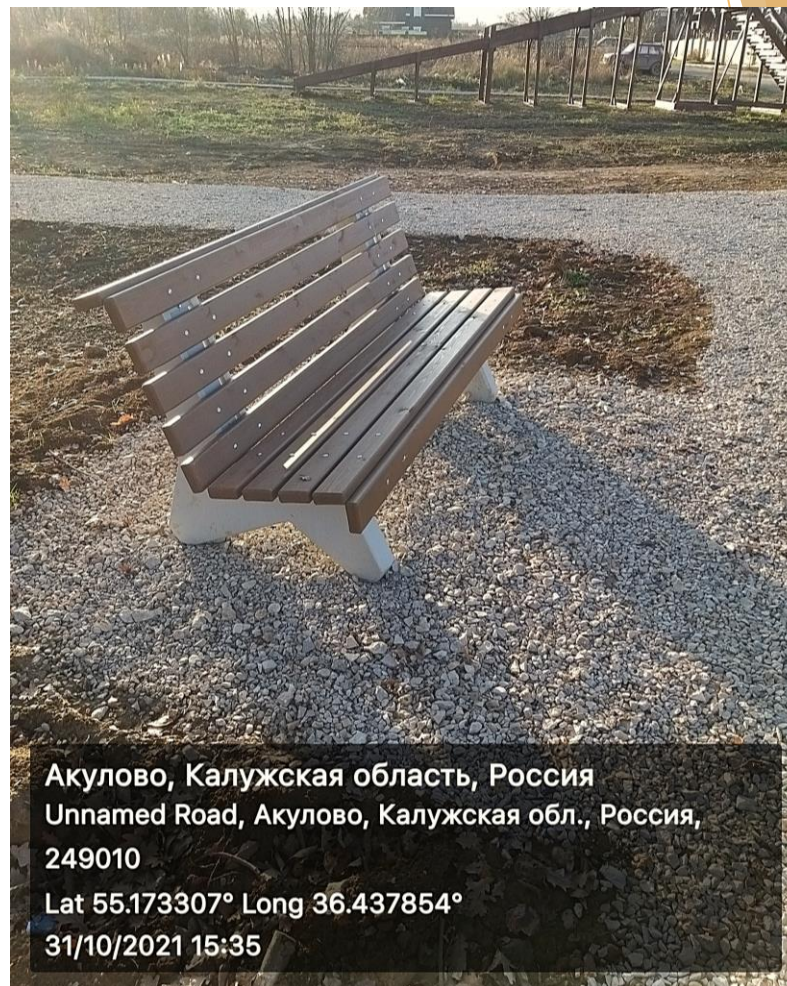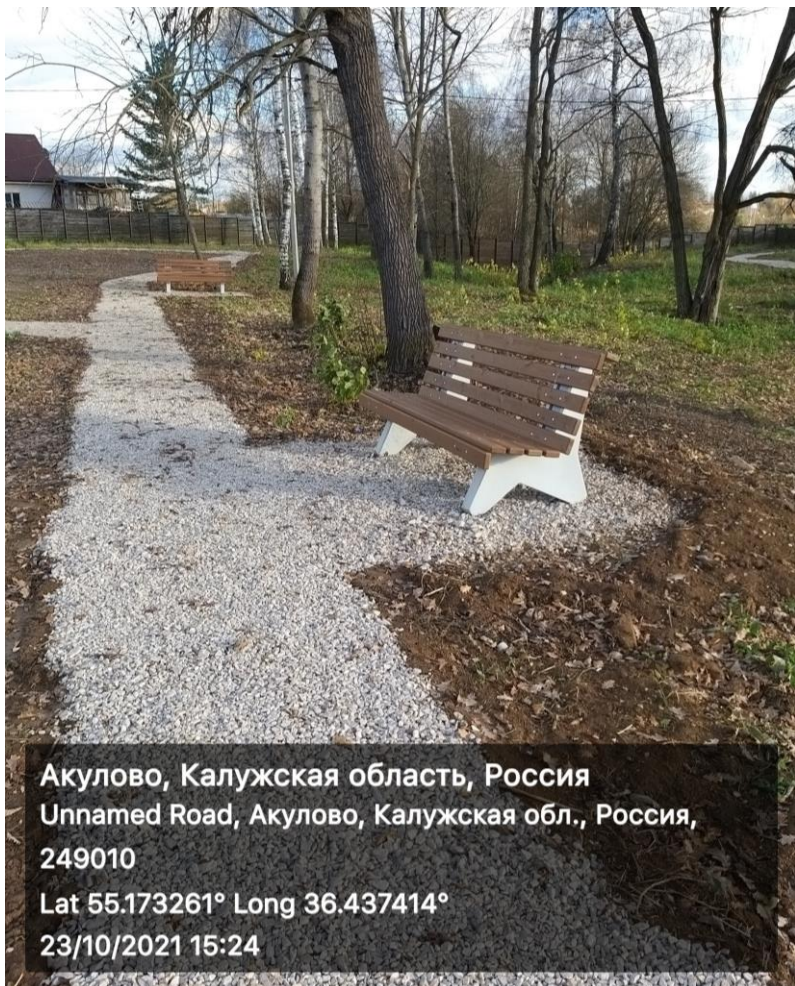

Установлено 5 уличных скамеек.

Этапы выполнения работ. Озеленение.

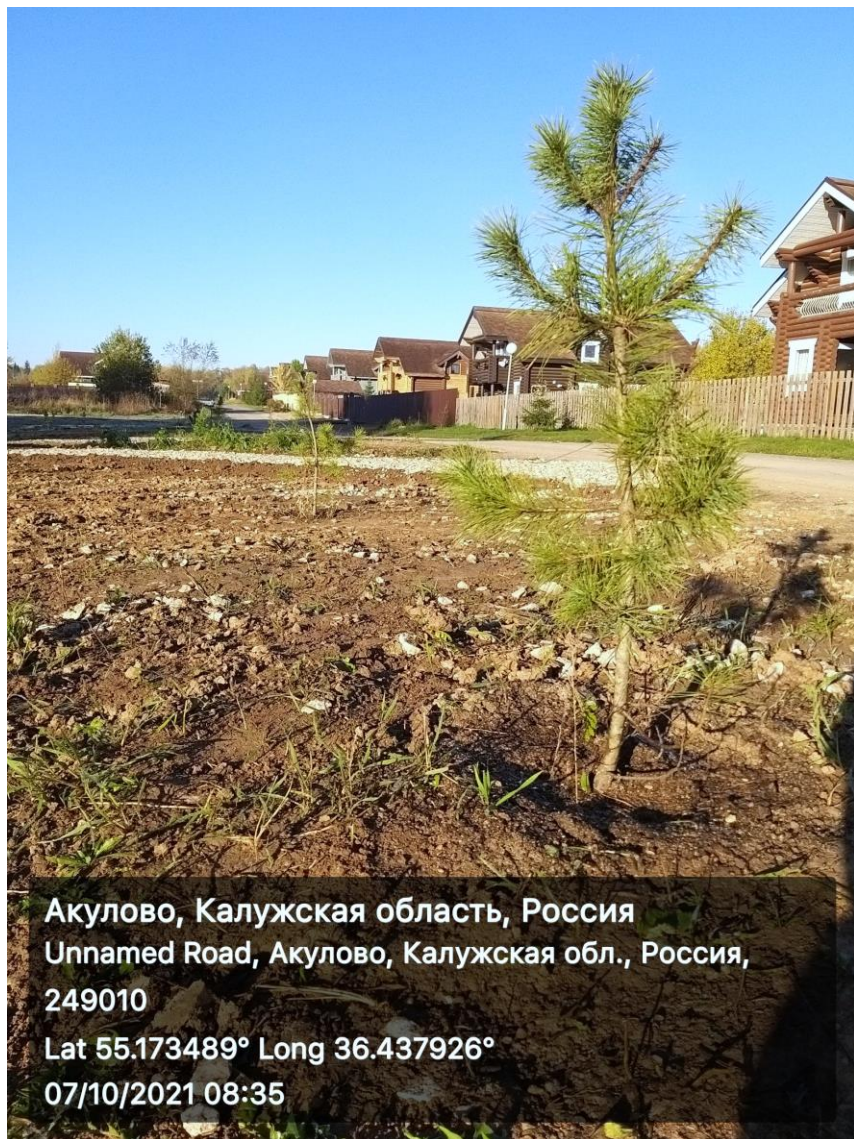

Этапы выполнения работ. Озеленение.



Посажено 18 хвойных деревьев: 1 серебристая ель и 17 кедровых сибирских сосен.

Календарный план реализации проекта

Этап	Сроки	Статус выполнения
Сбор средств жителей на реализацию проекта	10.05.2021	100 %
Проведение топосъемки, разработка эскизного проекта освоения территории с учетом заявок жителей, согласование проекта с администрацией сельского поселения	10.06.2021	100 %
Расчистка территории от мертвых деревьев и кустарника	04.07.2021	100 %
Планировка территории, выравнивание и вывоз грунта. Уборка и вывоз крупногабаритного мусора	15.10.2021	100 %
Организация дренажных отводов ливневых стоков	20.09.2021	100 %
Организация тропиночной дорожной сети	22.10.2021	100 %
Озеленение хвойными растениями	22.10.2021	100 %
Малые формы. Закупка и установка	20.09.2021	100 %
Установка опор и светильников уличного освещения	22.10.2021	100 %

Расходная часть проекта (сводная)

Этап	Сумма, руб.
Проведение топосъемки, разработка эскизного проекта освоения территории с учетом заявок жителей, согласование проекта с администрацией сельского поселения	20 000
Расчистка территории от мертвых деревьев и кустарника	90 000
Планировка территории, выравнивание и вывоз грунта. Уборка и вывоз крупногабаритного мусора	46 500
Организация дренажных отводов ливневых стоков. Организация тропиной дорожной сети. Озеленение хвойными растениями. Малые формы. Закупка и установка.	522 900
Закупка светильников уличного освещения	22 700
Установка опор и светильников уличного освещения	275 000
Информационная табличка	1 300

Расходная часть проекта по источникам финансирования

Спецификация	Сумма, руб. (план по проекту)	Сумма, руб. (факт.)
Средства областного бюджета, полученные в форме иных дотаций местным бюджетам для стимулирования муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления»	799 200	799 200 (82%)
Собственные средства ТОС	165 000	179 200 (18%)
Стоимость проекта, всего:	964 200	978 400 (100%)

Количество граждан, проживающих в границах ТОС: **125**

Количество граждан, участвующих в реализации проекта: **78**

Дополнительное благоустройство территории



Акулово, Калужская область, Россия
Unnamed Road, Акулово, Калужская обл., Россия,
249010
Lat 55.173373° Long 36.436882°
23/10/2021 15:22

На территории
общественного
пространства
установлена
детская зимняя
горка.

Итоги проекта



В рамках программы «Комфортная городская среда» в крупных населенных пунктах активно идет строительство детских, спортивных и общественных зон. Наш проект показал, как с привлечением жителей можно организовать комфортную общественную территорию в небольшой деревне.

В последующие годы предполагается дальнейшее развитие этой территории с участием жителей с обустройством всесезонных спортивной и детской зон.
